

Kvittering for graveforespørgsel

Graveforespørgslen er foretaget af:

Flemming Andersen
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

☎ 45 97 35 62
☎
✉ flema@ltk.dk

Graveaktør:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
2800 Kongens Lyngby

CVR 11715311
☎ 45 97 30 00
✉ arealerejendomme@ltk.dk

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:

Flemming Andersen
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

☎ 45 97 35 62
☎
✉ flema@ltk.dk

Oplysninger om graveforespørgslen:

LER nr.	3551689
Oprettelsestidspunkt	📅 14-09-2026 ⌚ 09:01
Formål	Gravearbejde
Graveart	Gravemaskine
Egne bemærkninger	Fuglevadsvej 49, 2800 Kongens Lyngby
Graveperiode	📅 01-10-2026 📅 14-10-2026
Areal	10725 kvm.
Gebyr	160,88 kr.

[Link til resultat](#)

Ledningsejere i området på graveforespørgselstidspunktet

Ledningsejer	Kontakt
Evida Service A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg ☎ 70 21 30 46 ✉ ledningsinfo@evida.dk	Ledningsinfo Vognmagervej 14 8800 Viborg ☎ 62 25 90 85 ✉ ledningsinfo@evida.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	
FIBIA P/S Energivej 33 4690 Haslev ☎ 70 29 29 01 ✉ ledningsoplysninger@fibla.dk	Fibia P/S Øst Energivej 33 4690 Haslev ☎ ✉ ledningsoplysninger@fibla.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	
GLOBALCONNECT A/S Havneholmen 6, st 2450 København SV ☎ 77 30 30 00 ✉ ledninger@globalconnect.dk	GlobalConnect A/S Havneholmen 6 2450 København SV ☎ 00 00 00 00 ✉ ledningsoplysninger@ninet.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📄 GC DK ZE 2017	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Firskovvej 38 2800 Kongens Lyngby ☎ 72 28 33 60 ✉ ler@ltf.dk	Anne Wilms Poulsen Hjortekærbacken 12 2800 Kongens Lyngby ☎ 41 77 97 02 ✉ ler@ltf.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📄 Oprettet af Geopartner Landinspektør A/S	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	

5

Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ☎ 45 97 30 00 ✉ arealerejendomme@ltk.dk	Timothy Patrick Needham Peter Lunds Vej 12B 2800 Kongens Lyngby ☎ 21 73 40 88 ✉ timon@ltk.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📍 Interesseområde upload for Lyngby-Taarbæk Kommune	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	

6

Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ☎ 45 97 30 00 ✉ arealerejendomme@ltk.dk	Birk Feilberg Møllestræde 5 3400 Hillerød ☎ 21 67 54 37 ✉ bfeil@ltk.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📍 Interesseområde for Vejbelysning i Lyngby-Taarbæk Kommune	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	

7

Norlys Telco A/S Slet Parkvej 5 8310 Tranbjerg J ☎ 88 20 83 44 ✉ OnsiteOperations.LER@norlys.dk	Norlys Telco A/S Ørestads Boulevard 45 2300 København S ☎ 88 31 50 92 ✉ DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📍 Henvendelser vedr. ledningsejermøder bedes fremsendt til DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com. Henvendelser vedr. akut brud/skade på Norlys Telco A/S ledninger kontakt venligst Eltel på tlf: 88 31 50 92	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	

8

Radius Elnet A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge ☎ 70 20 48 00 ✉ gravetilsyn@Cerius-Radius.dk	Elkontrolcenter Teknikerbyen 25 2830 Virum ☎ 70 20 58 00 ✉ gravetilsyn@cerius-radius.dk
* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke	
📍 Midt	
☑ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01	

9

TDC NET A/S

Teglholmsgade 1

2450 København SV

☎ 70 10 30 00

✉ zzzautoplan@tdc.dk

TDC NET Planudlevering

Teglholmsgade 1

0900 København

☎ 70 10 30 00

✉ zzzautoplan@tdc.dk


* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke

📌 Henvendelser vedr. ledningsejermøder bedes fremsendt til: anl_visitering@tdc.dk; Henvendelser vedr. akut brud/skade på TDC NET ledninger kontakt venligst TDC NET via <https://tdcnet.dk/anlaeg-visitering/kabelovergravning/>;

✓ E-mail afsendt d. 14. september 2026 kl. 09:01

Kort over graveområdet

Oversigtskort

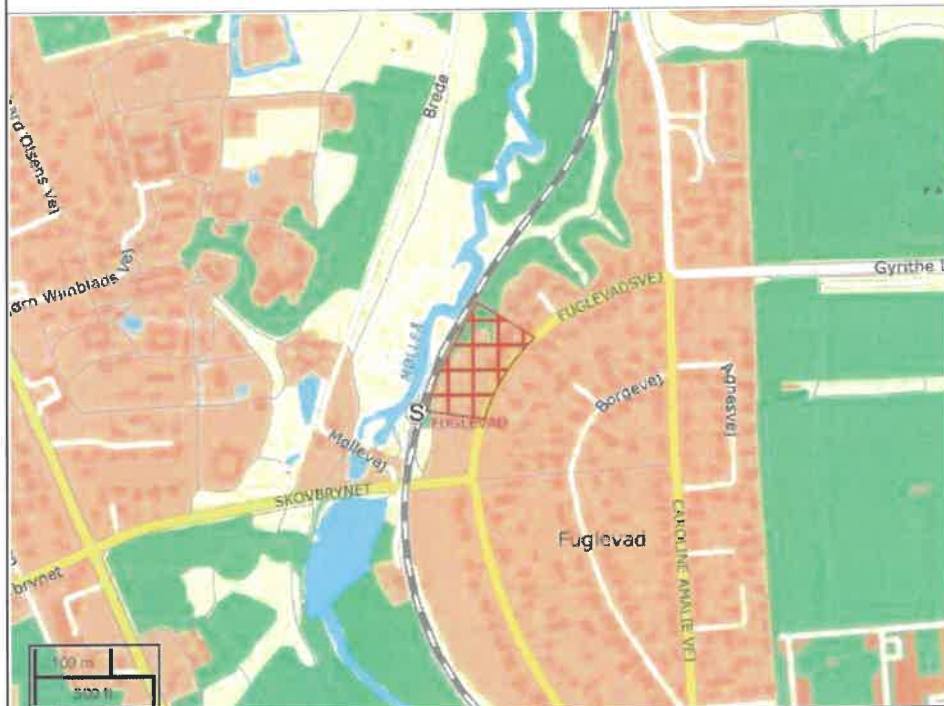

Detailkort



Forsyningsart

☒ Alle forsyningsarter

☒ Afløb

☒ El

☒ Føringssrør

☒ Gas

☒ Telekom

☒ Vand

Ledningsejere der sender via LER

☒ Alle ledningsejere

☒ Evida Service A/S

☒ FIBIA P/S

☒ GLOBALCONNECT A/S

☒ LYNGBY-TAARBÆK

☒ FORSYNING A/S

☒ Lyngby-Taarbæk Kommune

☒ Lyngby-Taarbæk Kommune

☒ Norlys Digital A/S

☒ Radius Elnet A/S

☒ TDC NET A/S



1

Indlæs ledningspakke

- ☒ Gas
- ☒ Telekom
- ☒ Vand

Ledningsejere der sender via LER

- ☐ Alle ledningsejere
- ☒ Evida Service A/S

Status
Ledningsoplysninger udliveret

Kontakt
Navn: Ledningsinfo
Email: ledningsinfo@evida.dk
Telefon: 70213046

Generelle oplysninger
• [oplysning_vedr_naturgaslednin](#)
[ger.pdf](#)

Gyldighedsdato
2026-10-12

Interesseområde
88714

ID
02b27634-81d8-4503-8282-7276a2343062

Yderligere information
Ledningsoplysninger er leveret med Volue
Cloud LER

- ☒ FIBIA P/S
- ☒ GLOBALCONNECT A/S

hent Kvittering



Følgrebrev til LER-forespørgsel – Vigtig information til graveaktør

Vedrørende: Ledningsoplysninger for det område, du har markeret i din LER-forespørgsel.

Vedlagt: Vedlagt er ledningsoplysningerne for det område, du har markeret i din LER-forespørgsel. Vedhæftede fil viser vores gasledninger i det markerede område.

Vigtig information til formand / gravefører

Dette brev **skal** udleveres til den ansvarlige formand eller gravefører på arbejdsstedet. Det er afgørende, at vedkommende orienterer sig grundigt i materialet.

Det anbefales at orientere sig i brochuren "Pas på gasledningerne!", som indeholder information om arbejde nær gasledninger: [Se folderen "Pas på gasledningerne" \(pdf\)](#)

Sikkerhed og ansvar

Gravearbejde sker på **graveaktørens eget ansvar**. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Overgravning af gasledninger kan have store konsekvenser og gøre skade på bygninger, materiel og i værste tilfælde personskade.
- Derudover er afbrydning af gasforsyningen til gene for forbrugerne, men også for graveaktøren, som skal betale alle omkostninger forbundet med afbrydelsen, herunder: genetablering, gasudslip, skader på bygninger, materiel og personer m.v.

Forsikringsforhold

Graveaktøren skal have indhentet og **medbringe ledningsoplysninger** under hele gravearbejdet. Hvis dette ikke overholdes, **dækkes skader ikke af forsikringen**.

! Dette gælder også, hvis en anden graveaktør overtager opgaven. Forsikringsforhold vedrørende arbejdet påhviler til enhver tid den udførende graveaktør, og Evida har ingen rolle eller ansvar i den forbindelse.



Gyldighed

Ledningsoplysningerne er gyldige i **1 måned** fra modtagelsen. De må kun anvendes **inden for det LER søgte område og til det oplyste formål**.

Stik og distributionsledninger

Ved arbejde omkring plastledninger/ distributionsledninger.

- Ved anlægs- eller gravearbejde indenfor risikozonen ved en distributions- eller stikledning skal afstandskrav overholdes. Se afsnit 7 i Pas på gasledningerne!
- Ved jordfortrængning eller underboring må gasledningen ikke krydses eller parallelføres under 2 meter uden tilladelse fra Evida. Se afsnit 10 i "[Pas på gasledningerne 2025](#)" (pdf)
- Hvis graveaktøren kender placeringen af distributionsledning, er det ikke nødvendigt at bestille afsætning. Dog må gasledningen ikke frigraves tættere end 0,5 meter med maskine. Resten graves med en forsigtig håndskovl

Bestilling af påvisning

- Bestilling af påvisning foregår via evida.dk, hvor følgende formular skal udfyldes: [Påvisning af ledning](#)

Betaling

- Påvisning af stik- og distributionsledninger udføres mod betaling. Se gældende priser på: [Priser](#)

Fordelings- og transmissionsledninger

Ved arbejde omkring fordelings- eller transmissionsledninger (Stål 19-50 bar).

- Al anlægsarbejde tættere end 10 meter fra en gasledning 19-50 bar kræver en afsætning/påvisning af Evida (bestilles af entreprenøren).
- Al anlægsarbejde tættere end 5 meter fra en gasledning 19-50 bar kræver en aftale med Evida.
- Alle former af bygninger tættere end 20 meter fra en gasledning over 19 bar kræver en skriftlig aftale med Evida, for at afklare eventuelle servitutter med sikkerhedszoner på mere end 5 meter.

For at kunne lave en skriftlig aftale skal følgende sendes til Fnet@evida.dk

(I mailens emnefelt påføres LER nr.)

1. En skitse/tegning, som viser ønskede afstande til gasledningen samt
2. En beskrivelse, der som minimum indeholder;
 - tidsplan for arbejdet (forventet dato for udførsel).
 - info om anlægstype, spændingsniveau eller evt. medie i rør.
 - ønsket arbejdsmetode (boring, gravning eller andet).
 - foreløbigt boreprofil med indtegning af gasledning.

Her finder du Evida's krav og vejledning til respektafstande og tilsyn: [Grave-, bore- og anlægsarbejder tæt på gasledninger \(19-50 bar\)](#).

- Frigravning/prøvegravning skal altid aftales med Evida. Gasledningen skal holdes dækket med vintermåtter, så længe den er synlig.
- En gasledning må ikke frigraves tættere end 0,5m med maskine, hvorefter resten frigraves med en forsigtig håndskovl.
- En frigravet gasledning må aldrig dækkes til uden tilsyn fra Evida.

Påvisning af en gasledning **udløser ikke automatisk en godkendelse af arbejdet.**

Se: [Grave-, bore- og anlægsarbejder tæt på gasledninger \(19-50 bar\)](#)

Bestilling af påvisning

- Bestilling af påvisning foregår via [evida.dk](#), hvor følgende formular skal udfyldes: [Påvisning af ledning](#)

Betaling

- Påvisning og tilsyn i risikozonen er gratis, når arbejdet sker efter skriftlig aftale og godkendelse af projektet.

Ved projektering

- Projekterede ledninger er skitserede, og de kan være anlagt eller under anlæg. Den viste placering er kun udtryk for den forventede placering. Kontakt Ledningsinfo, hvis du skal grave i nærheden – placeringen er forventet, ikke præcis.
- Den udleverede digitale GML-fil fra LER.dk, er med X, Y og Z-koter målt på overkant af røret.
- Se vejledning vedrørende behandling af GML – fil på LER.dk.

Kontakt Evida's Ledningsinfo ved spørgsmål om gasledningernes placering samt tekniske forskrifter for afsætning og påvisning af gasledninger.

For yderligere information og hjælp henvises desuden til Evida's entreprenørsite, hvor relevante vejledninger og ressourcer er tilgængelige: [Påvisning af ledning](#)

Med venlig hilsen

Ledningsinfo@evida.dk

OBS: Ved overgravning eller anden skade, kontakt: Kontrolcenter Tlf. 62 25 90 11

2

1

1



1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



10

100

100

10

100



3

Indlæs ledningspakke

- Alle forsyningsarter
- Afløb
- El
- Føringsrør
- Gas
- Telekom
- Vand

Ledningsejere der sender via LER

- Alle ledningsejere
- Evida Service A/S
- FIBIA P/S
- GLOBALCONNECT A/S

Status
Ledningsoplysninger udlleveret

Kontakt
Navn: GlobalConnect A/S
Email: Ledninger@globalconnect.dk

Generelle oplysninger
• [Følggebrøw_GlobalConnect_jun_2023.pdf](#)

Gyldighedsdato
2026-10-05

Interesseområde
74813

ID
4f6825b4-19c1-4096-9b97-520ac2310fd9

Print Kvittering





Følgrebrev til ledningsforespørgsel.

Du har via LER forespurgt på et område, og vi har fundet frem til, at vi har kabler i dette område. Følgende betingelser er gældende for benyttelse af GlobalConnects ledningsoplysninger.

Gyldighedsperiode:

Ledningsoplysningernes gyldighed er oplyst i ledningspakken. Udføres arbejdet efter endt gyldighedsperiode, skal der rekvireres nye ledningsoplysninger.

Udleveret materiale:

GlobalConnect viser i LER 2 et tracé, hvor der kan være et eller flere rør og et eller flere lyslederkabler. Borerapporter vedlægges i LER 2, såfremt de forefindes.

Sikkerhedsafstande:

Er tracéet indmålt skal der regnes med sikkerhedsafstand på 0,5 m på begge sider af tracéet. Den vejledende dybde er 0,5 m, men ligger normalt i dybder mellem 0,3-0,8 m. Er tracéet med en Nøjagtighedsklasse > 0,50 m skal graveaktøren udvise ekstra forsigtighed og evt. rekvirere en kabelpåvisning, hvis tvivlsspørgsmål opstår.

Der skal benyttes håndskovl indenfor sikkerhedsafstanden.

Kabelpåvisning:

Skulle du have spørgsmål til det fremsendte materiale og/eller ønsker du yderligere oplysninger, herunder påvisning, bedes du venligst kontakte GlobalConnect på Ledninger@globalconnect.dk. Vi gør opmærksom på, at samtlige omkostninger i forbindelse med en ønsket påvisning vil blive viderefaktureret til dig.

I tilfælde af kabelskade:

Hvis der under gravearbejde sker skader på rør eller kabel, eller er der formodning herom, skal der tages kontakt til GlobalConnects OMC på telefon +45 7730 3188.

Forvoldes der skader på GlobalConnect A/S' rør og/eller kabler i forbindelse med entreprenørarbejde, vil skadevolder blive gjort ansvarlig i henhold til gældende erstatningsregler.

Ledningsejermøder og yderligere spørgsmål:

Sendes til Ledninger@globalconnect.dk

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüßen/Best regards

GlobalConnect A/S

Ledninger

Telefon: +45 7730 3188

Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Inklæs ledningspakke

Ledningsejere der sender via LER

- ☐ Alle ledningsejere
- ☐ Evida Service A/S
- ☐ FIBIA P/S
- ☐ GLOBALCONNECT A/S
- ☒ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Anne Wilms Poulsen
Email: lw@lf.dk
Telefon: 72 28 33 60

Generelle oplysninger
• [Lyngby-Taarbæk Forsyning - Vigtig Info.pdf](#)

Gyldighedsdato
2026-10-14


Interesseområde
90712

ID
85de75dc-b00a-11f1-bd1f-e738ebf3a59a

Yderligere information
Denne mailadresse er kun til LER-
aanmodninger. Alt andet skal sendes til
forsyning@lf.dk

☐ Lyngby-Taarbæk Kommune

Vent Kittering

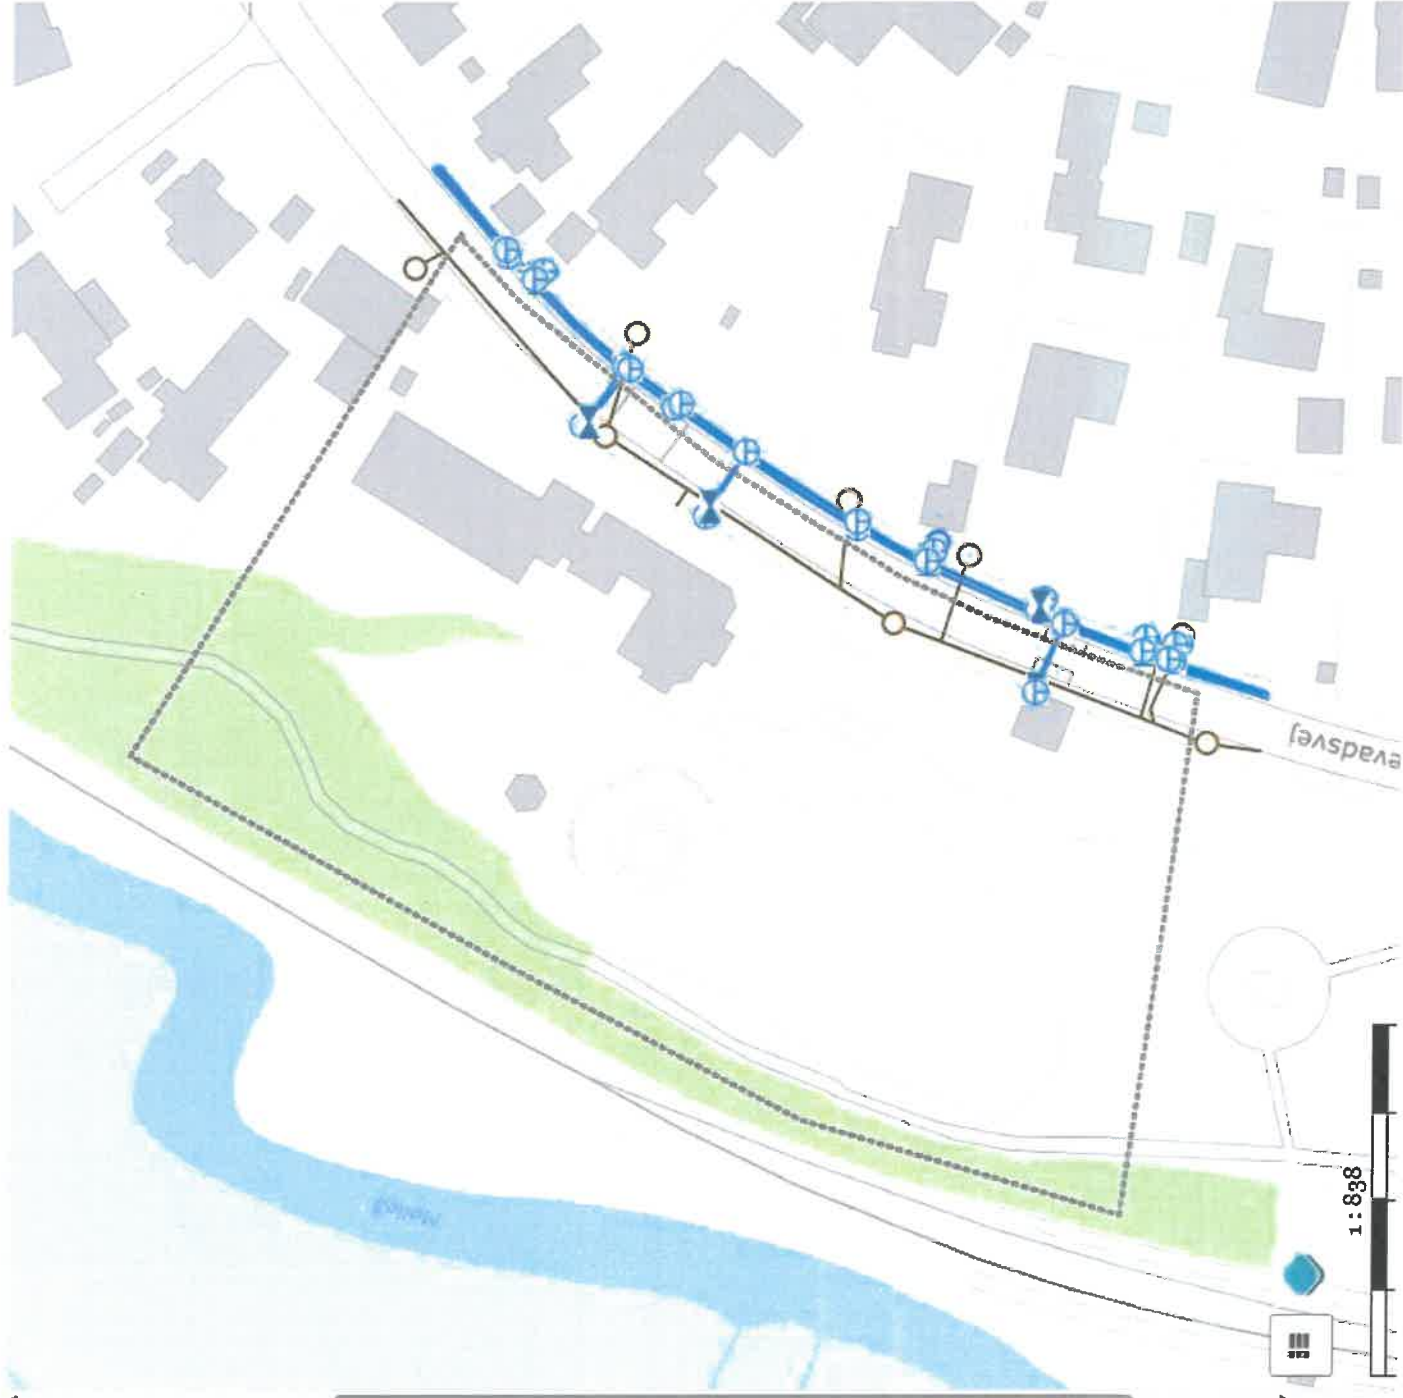

Vigtig information ved gravearbejder i nærheden af Lyngby-Taarbæk Forsynings drikke- og spildevandsledninger

Dette brev skal udleveres til den ansvarlige formand eller gravefører på arbejdsstedet. Det er afgørende, at vedkommende orienterer sig grundigt i materialet.

Gældende respektafstande i DS475 skal altid overholdes.

Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning før arbejdet går i gang, i følgende tilfælde:

Drikkevandsledninger

- Frigravning af drikkevandsledninger i dimension 100 mm eller derover
- Spunsning, styret underboring eller lignende arbejder inden for 1,5 meter fra alle drikkevandsledninger

Spildevandsledninger

- Frigravning af alle forsynings spildevandsledninger
- Spunsning, styret underboring eller lignende arbejder inden for 1,5 meter fra alle forsynings spildevandsledninger

Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning straks, hvis:

- Der konstateres fejl i ledningsoplysninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Ledninger blottes eller beskadiges

Lyngby-Taarbæk Forsyning forbeholder sig ret til altid at kunne tilgå eller bese egne ledninger.

Kontaktinformation

Telefon 72 28 33 60

Åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 09.00-15.00

Fredag: kl. 10.00-14.00

Uden for åbningstiden skal I ringe til vagttelefonen 72 28 33 60.

5

Inklæs ledningspakke

☒ Alle forsyningsarter

- ☒ Afløb
- ☒ El
- ☒ Føringør
- ☒ Gas
- ☒ Telekom
- ☒ Vand

Ledningsejere der sender via LER

- ☐ Alle ledningsejere
- ☒ Evida Service A/S
- ☒ FIBIA P/S
- ☒ GLOBALCONNECT A/S
- ☒ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
- ☒ Lyngby-Taarbæk Kommune

Status
Ledningsoplysninger udleveret ☒

Kontakt
Navn: Center for Arealer og Ejendomme
Email: arealerejendomme@ltk.dk
Telefon: 45878033

Interesseområde
20638

ID
2dd561ed-c5fc-42c8-a090-72d3c9824ce4

Yderligere information
Ledningsdata for Lyngby-Taarbæk Kommune

hent Kvittering



6

Indlæs ledningspakke

- ☒ Gas
- ☒ Telekom
- ☒ Vand

Ledningsejere der sender via LER

- ☐ Alle ledningsejere
- ☐ Evida Service A/S
- ☐ FIBIA P/S
- ☐ GLOBALCONNECT A/S
- ☐ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune
- ☒ Lyngby-Taarbæk Kommune

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Ledningsoplysninger
Email: info@softdesign.dk
Telefon: 27473741

Gyldighedsdato
2026-10-14

Interesseområde
90885

ID
0280af34-970e-43db-bcb9-b8658a0d3boe

Yderligere information
Leveret af Soft Design

Print Kvittering



7

Indlæs ledningspakke

☒ Vand

Ledningsejere der sender via LER

- ☐ Alle ledningsejere
- ☐ Evida Service A/S
- ☐ FIBIA P/S
- ☐ GLOBALCONNECT A/S
- ☐ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune
- ☒ Norlys Digital A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Telia/ELTEL
Email: DKSM@TeliaDrift@telianetworks.com
Telefon: 88 31 50 92

Gyldighedsdato
2026-10-14

Interesseområde
90987

ID
2af5ab30-781c-4ecb-865f-45132b38a5fd

- ☐ Radius Elnet A/S
- ☐ TDC NET A/S

Print Kvittering



Indlæs ledningspakke

- ☐ Evida Service A/S 
- ☐ FIBIA P/S 
- ☐ GLOBALCONNECT A/S 
- ☐ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S 
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune 
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune 
- ☐ Norlys Digital A/S 
- ☒ Radius Elnet A/S 

Status

Ledningsoplysninger udleveret 

Kontakt

Navn: Ledningsoplysning
Email: gravtilsyn@cefnis-radius.dk

Generelle oplysninger

- [grav_siklert.pdf](#) 
- [foer_du_graver.pdf](#) 

Gyldighedsdato

2026-11-14

Interesseområde

85788

ID


3e9b96b-4f28-4dd9-a170-7a342f99ebd6

Yderligere information

ledningsoplysninger er udleveret

- ☐ TDC NET A/S 

Print Kvittering 

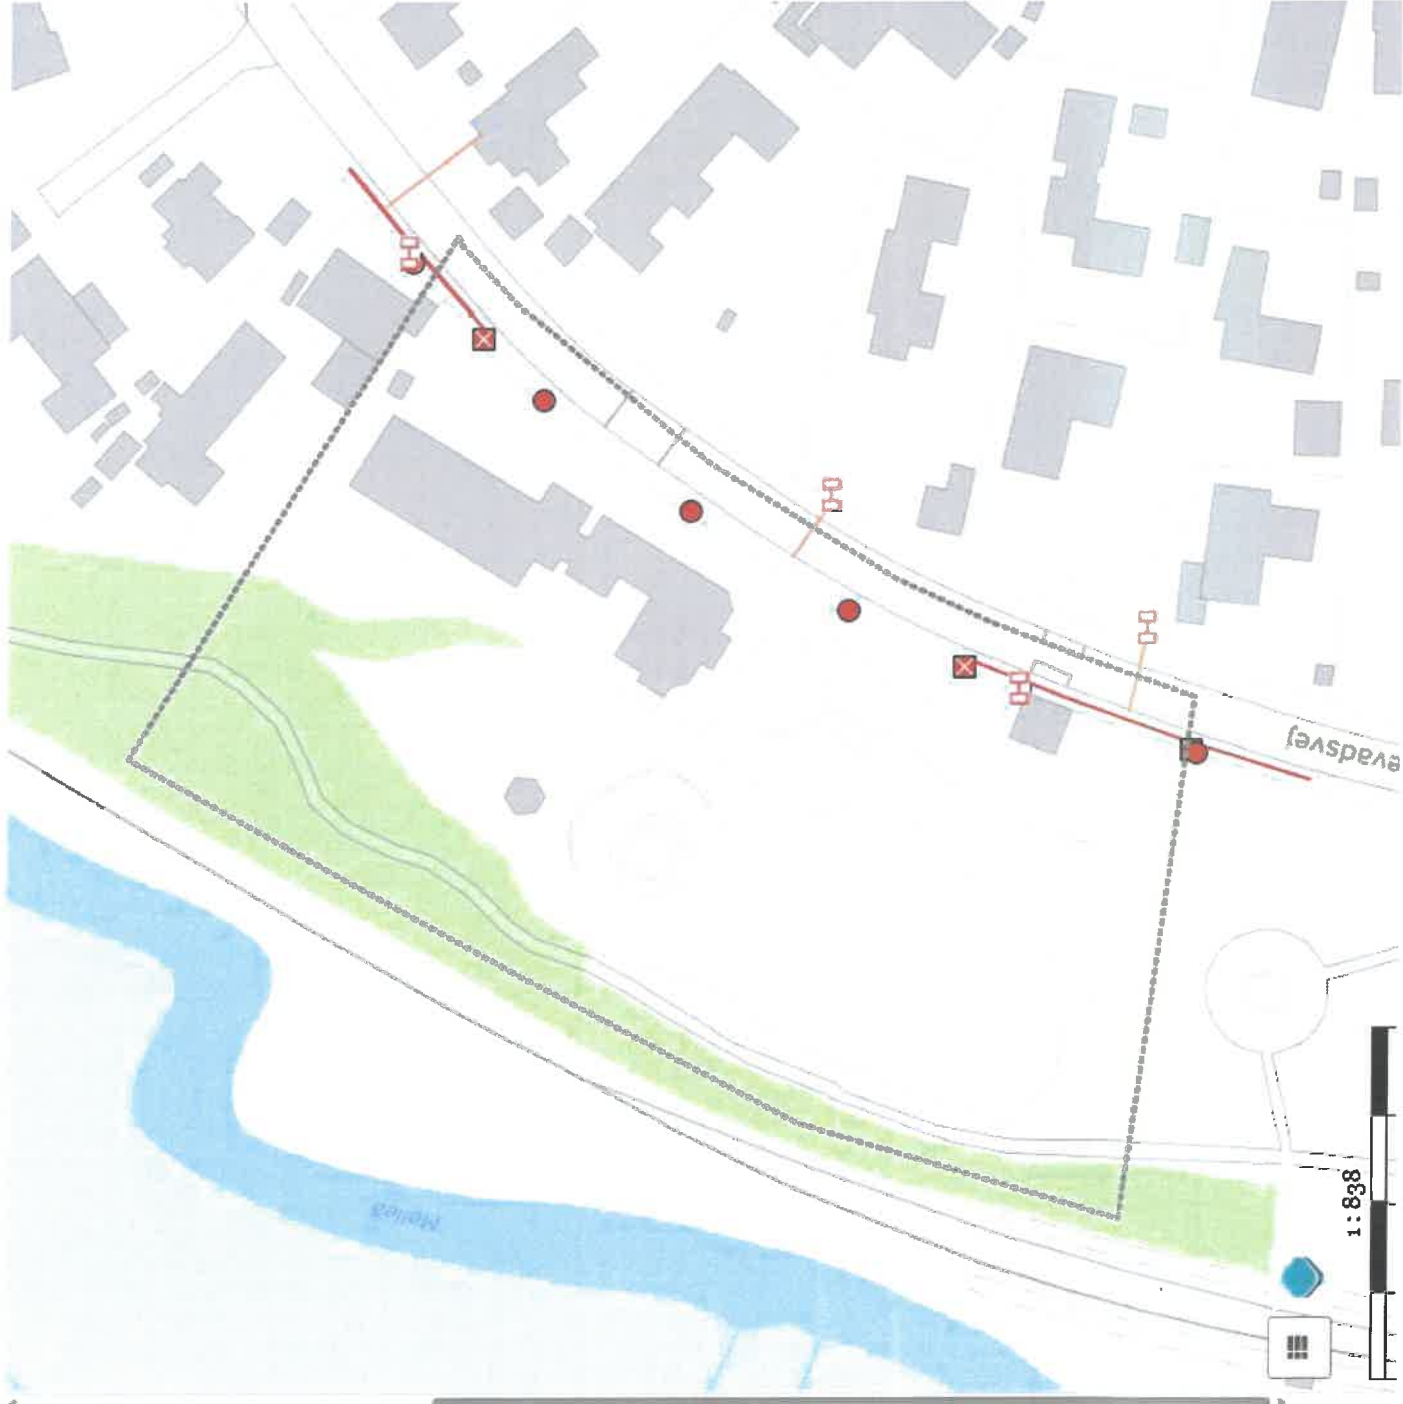

1:838

Grav sikkert

Pas på dig selv, når du graver

Inden du begynder at grave

Indhent altid information om kabler i jorden i ledningsejerregistret (LER).

Hvis der ligger kabler i jorden, hvor du skal grave, så kontakt det relevante elnetselskab for at aftale nærmere.

Du finder kontaktoplysninger til Cerius og Radius Elnet på side 2.

Skal du grave et kabel fri?




- Brug altid en skovl – aldrig drænspeade eller lignende.
- PAS PÅ ikke at ramme kablet, det kan være livsfarligt!

Skal du grave med maskine?



- Grav kun til dækplast, markeringsbånd eller andet afdækningsmateriale.
- Der skal altid være en observatør med en skovl i udgravningen.

Skal du lave underboring eller skydning



- Ring til det elnetselskab, som dækker området, for at aftale nærmere.

Grav sikkert

Pas på dig selv, hvis uheldet sker

Hvis du kommer til at ramme eller beskadige et kabel

- Hold en afstand til kablet på **MINDST 10 METER**. Berør **ALDRIG** kablet, og forsøg **IKKE** at børste jord af det.
- Ring til det relevante elnetselskab for at give os besked. Du finder kontaktoplysninger nederst på denne side.
- Forsøg under ingen omstændigheder at reparere med tape eller lignende – det kan være livsfarligt!
- Bliv på stedet, så ingen kommer i nærheden af kablet.

Hvis nogen får stød

- Ring **1-1-2** ved alvorlige ulykker eller stød.
- Du skal **ALTID** undersøges på hospitalet, hvis du har fået stød.
- Du må **IKKE** selv køre til hospitalet, hvis du har fået stød.

Har du spørgsmål

Kontakt det lokale elnetselskab (Cerius eller Radius Elnet). Du kan ringe eller sende en mail - se kontaktoplysninger nederst på siden. Se også "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg" for mere information.

Hold afstand



Det er entreprenørens ansvar, at medarbejderne er instrueret.

Telefonopkald bliver automatisk optaget

Hvis du bliver ringet op af Cerius' eller Radius Elnets Elkontrolcenter, bliver telefonsamtalen optaget. Vi har i henhold til GDPR-reglerne pligt til at oplyse dig om dette forhold og henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, (legitime interesser) som grundlag for, at vi må foretage disse optagelser. Vores legitime interesse er at sikre person- og forsyningssikkerhed. Formålet med optagelserne er at udrede og minimere hændelser i vores forsyningsnet og kvalitetssikre vores hertil relaterede processer – særligt de sikkerhedsmæssige forhold. Optagelserne aflyttes kun i forbindelse med hændelser i elnettet, og de bliver slettet senest efter tre måneder.

Cerius

Teknikerbyen 25 • 2830 Virum • info@cerius.dk • cerius.dk • 70 29 20 24

Radius


Teknikerbyen 25 • 2830 Virum • gravetilsyn@radiuselnet.dk • radiuselnet.dk • 70 20 58 00

Vejledning til dig som entreprenør

Før du graver nær ved elkabler



cerius · radius

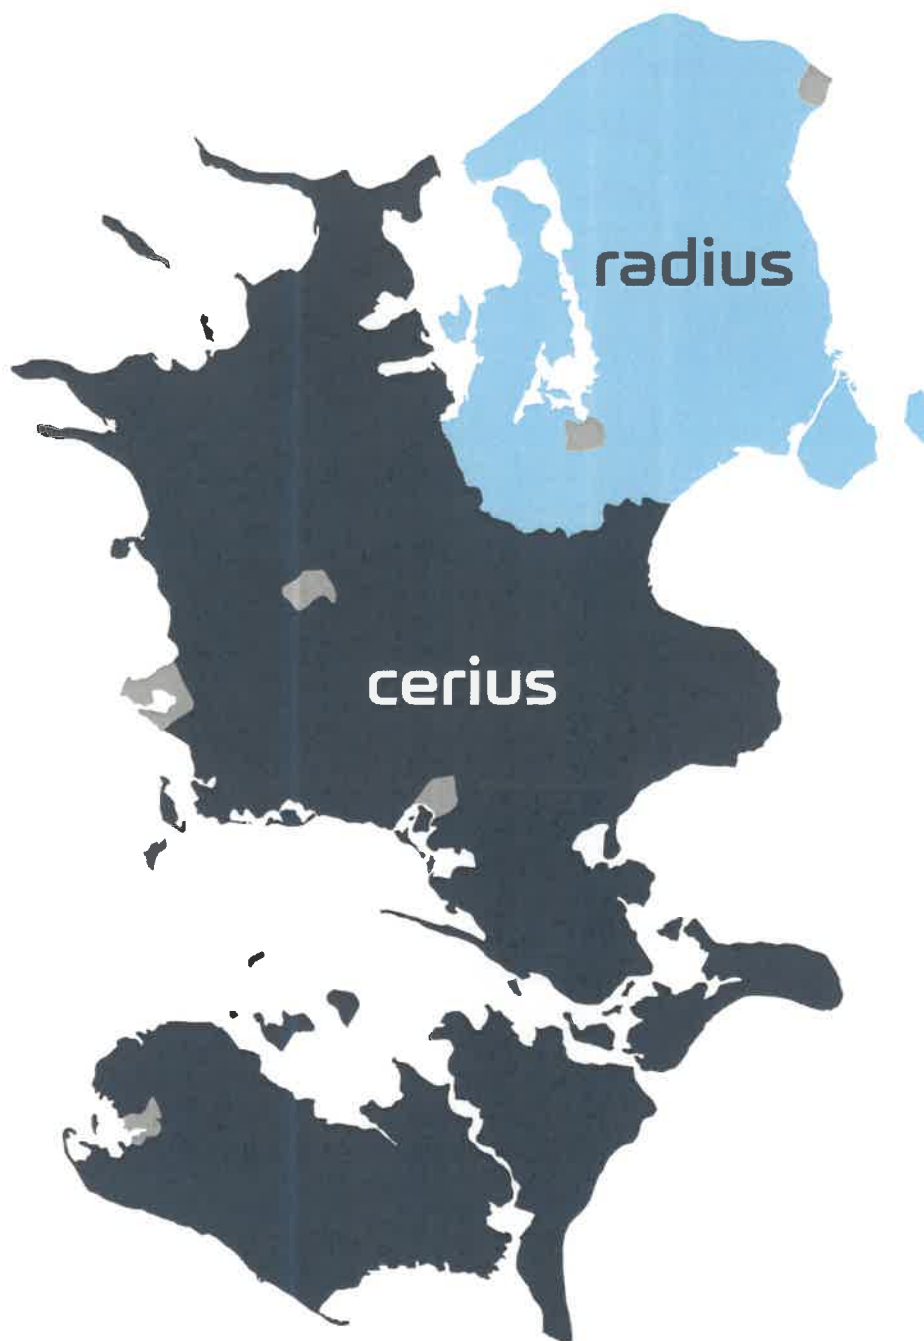**Radius**

gravetilsyn@cerius-radius.dk

Cerius

gravetilsyn@cerius-radius.dk

Tlf. (kun til akutte, sikkerhedsrelaterede henvendelser, fx anmeldelse af skader):

Cerius: 70 29 20 24

Radius: 70 20 58 00

Telefonopkald bliver automatisk optaget

Hvis du bliver ringet op af Cerius' eller Radius Elnets elkontrolcenter, bliver telefonsamtalen optaget.

Vi har i henhold til GDPR-reglerne pligt til at oplyse dig om dette forhold og henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, (legitime interesser) som grundlag for, at vi må foretage disse optagelser. Vores legitime interesse er at sikre person- og forsyningsikkerhed. Formålet med optagelserne er at udrede og minimere hændelser i vores forsyningsnet og kvalitetssikre vores hertil relaterede processer – særligt de sikkerhedsmæssige forhold. Optagelserne aflyttes kun i forbindelse med hændelser i elnettet, og de bliver slettet senest efter tre måneder.

Indholdsfortegnelse

5	Før du graver nær ved vores elkabler
6	Sikkerheden i fokus
7	Grav sikkert – pas på dig selv
8	Installatørens pligter, ved stik- og gravearbejde
9	Typer af elkabler
12	Kontakt os før du går igang
14	Sikkerhedsafbrydelse og beskyttelse
16	Krydsning af elkabler ved jordfortrængning
18	Hvis du skal krydse elkabler med fjernvarmerør
20	Retablering af en kabelgrav
22	Afstand mellem elkabler, ledninger og rør



Før du graver nær ved vores elkabler

Denne folder er en vejledning til entreprenører, der skal grave nær ved vores elkabler. Folderen fritager dig ikke for at sætte dig ind i og følge gældende lov på området.

Inden du begynder at grave i nærheden af vores elkabler, skal du altid:

- Hente oplysninger i Ledningsejerregisteret (LER). Entreprenørerne skal sørge for, at der til enhver tid arbejdes efter gældende ledningsoplysninger, som skal forefindes på arbejdsstedet.
- Er tegningerne forældede, eller er der tegn på nylig opgravning på arbejdsstedet, skal du bestille nye oplysninger.
- Kontakte Cerius eller Radius Elnet, hvis du skal grave inden for en meters afstand til et elkabel (se kortet på side 2 for kontaktoplysninger).

Du er altid velkommen til at kontakte os for at afklare præcist, hvordan du skal grave, eller hvornår det er muligt at udføre arbejdet, hvis spændingen til kablet skal afbrydes.

Det er entreprenøren, der afholder alle omkostninger til sikring af arbejde nær elkabler i forbindelse med gravearbejde.

Sikkerheden i fokus

Du skal altid overholde Elsikkerhedsloven, når du graver nær ved elanlæg. Både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til forsyningssikkerheden.

De bestemmelser, som du skal være særligt opmærksom på, finder du i "Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse af ikke elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

"For grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af elkabler med tilhørende kabelskabe og kasser gælder, at der skal udvises forsigtighed for at undgå at beskadige disse anlæg.

- Ved arbejde i jorden inden for en afstand på en meter til den placering af et elkabel, som Cerius eller Radius Elnet har oplyst, skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos Cerius eller Radius Elnet.
- Frigravning af elkabler i jorden skal foregå efter Cerius' eller Radius Elnets anvisninger.
- Afmærknings- og dækmateriale for elkabler må ikke fjernes uden Cerius' eller Radius Elnets tilladelse.
- Retablering skal ske efter Cerius' eller Radius Elnets anvisning.
- Hvis der er risiko for, at et frigravet elkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på passende måde efter Cerius' eller Radius Elnets anvisning.

- I tilfælde af, at en prøvegravning er nødvendig, og kablet ikke lokaliseres ved denne, skal entreprenøren ALTID kontakte Cerius' eller Radius' gravetilsyn, der kan vejlede yderligere i den aktuelle situation (send en mail - se side 2 for kontaktoplysninger).

Hvis du vil vide mere

Læs mere i Elsikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser og standarder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

NB!

Det er ikke tilladt at flytte, skære i eller fjerne Cerius eller Radius Elnets elkabler uden skriftlig tilladelse fra os.


Grav sikkert - pas på dig selv!

Hvis du kommer til at ramme eller beskadige et elkabel

- Hold en afstand til kablet på mindst 10 meter. Rør aldrig kablet.
- Ring til Cerius eller Radius Elnet (find kontaktoplysninger til akutte tilfælde på side 2).
- Forsøg ikke at børste jord af kablet, at reparere det med tape eller lignende det kan være livsfarligt.
- Bliv på stedet så ingen kommer i nærheden af kablet.

Hvis nogen får stød

- Ring 1-1-2 ved alvorlige ulykker.
- Du skal altid undersøges på hospitalet, hvis du har fået stød.
- Du må ikke selv køre til hospitalet, hvis du har fået stød.

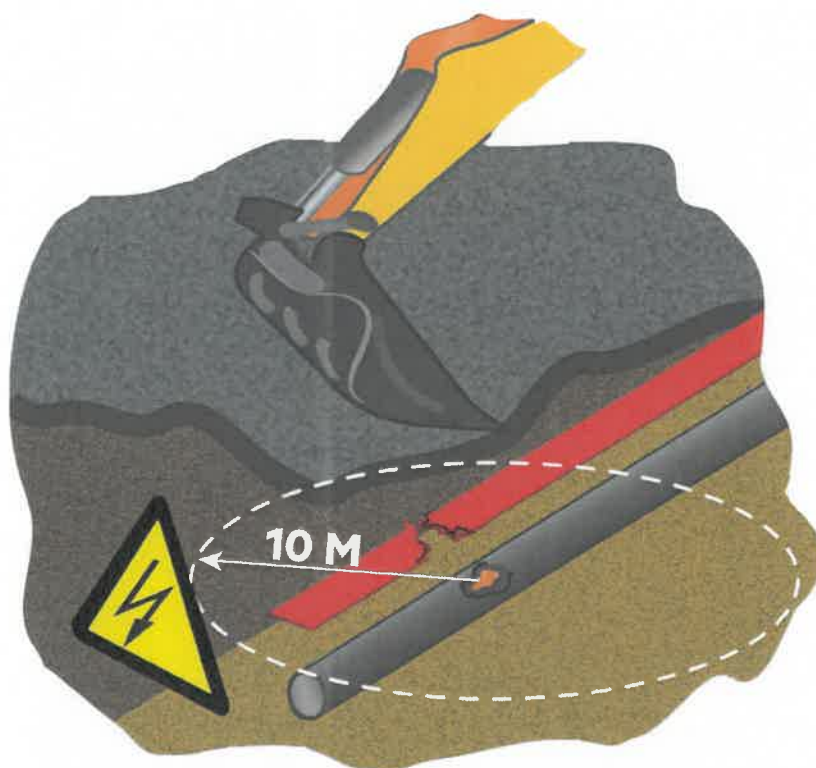

Hold afstand

Respektafstand 10 meter

Installatørens pligter ved stik- og gravearbejde

Før gravearbejdet startes skal du:

- Klarlægge myndighedskrav samt tage kontakt til relevante vejadministrationer. Ved private arealer skal du kontakte grundejerne.
- Supplere med opmålinger og prøvegravninger.
- Oprette en forespørgsel i LER (ledningsejerregistret) og indhenteoplysninger om eksisterende ledningsanlæg inden for arbejdsområdet.

OBS: Hvis du har lokalkendskab og erfaring fra tidligere gravninger på samme sted, kan dette indgå i processen. Det kan begrænse omfanget af nye forundersøgelser.

Under gravearbejdet skal du:

- Foretage en løbende risikovurdering af gravearbejdet, der udføres. Der må ikke graves så tæt ved master, skabe eller transformerstationer, at der opstår risiko for, at de kan vælte eller skride ud i kabelgraven.
- Overholde DS 475 norm for etablering af ledningsanlæg i jord og 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg' (BEK nr. 112 af 18-08-2016). Både for egen sikkerheds skyld og ad hensyn til forsyningssikkerheden.
- Afspærre og løbende sikre gravearbejdet og stikkablet, efter gældende lovgivning.

- Reetablere umiddelbart efter at stikkablet er fremført til et kabelskab eller en transformerstation. En kabelgrav eller udgravning må ikke stå åben i mere end 14 dage, da der herved er forøget risiko for utilsigtet afbrydelse, personskade eller materiel skade med erstatningskrav eller bøde til følge.

OBS: Du kan tage kontakt til vores grave-tilsyn, hvis du har behov for tilladelse til, at stikkablet undtagelsesvis er i en åbentstående kabelgrav i længere tid. Det gælder især ved projektarbejde på større byggepladser.

Efter gravearbejdet skal du:

- Dække alle stikkabler inkl. byggestik op og reetablere senest 14 dage efter, at arbejdet i kabelgraven er afsluttet. Du skal reetablere iht. gældende lovgivning. Det skal være muligt at betjene elforsyningsanlægget på en sikker måde.
- Sikrer dig, at du lever op til vores kvalitetskrav for reetablering. Arealet skal have samme udseende og egenskaber som det oprindelige areal med hensyn til bæreevne, deformationsegenskaber og drænevne.
- Udbedre sætninger og andre kvalitetsbrister umiddelbart efter konstatering. Udbedringen sker for entreprenørens egen regning.


Typer af elkabler

På de næste sider kan du læse mere om de forskellige typer elkabler, og hvorledes de sædvanligvis placeres i en kabelgrav. På grund af terræncændringer og særlige forhold kan kablerne ligge i forskellige dybder.

0,4 kV kabler

0,4 kV lavspændingskabler findes både som forsyningskabler, som kabler til trafik anlæg og som stikkabler.

Lavspændingskabler kan enten være jernbåndsarmerede eller lavet af plast – oftest i sort eller grå farve. Kablernes yderdiameter varierer fra 10 mm til 70 mm. Spændingen til lavspændingskabler bliver normalt ikke afbrudt, når der arbejdes nær ved dem.

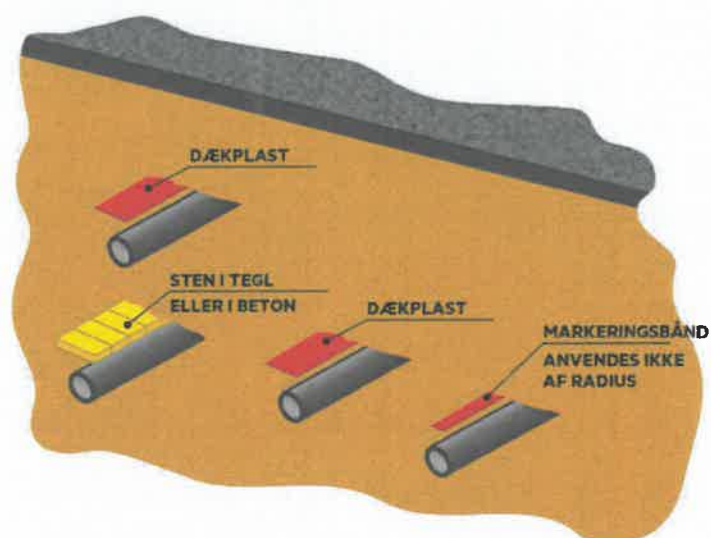

Typer af kabler

Nedgravningsdybder og typer af afdækning for 0,4 kV kabler (lavspænding)

10 kV kabler

10 kV kabler kan enten være jernbåndsarmerede eller lavet af plast. Yderkappen er typisk rød, blå eller sort. Kablernes yderdiameter varierer fra 35 mm til 70 mm.


Spændingen til 10 kV kabler sikkerhedsafbrydes normalt kun, hvis der skal graves fri omkring muffen. Bestil afbrydelsen ved at kontakte os senest 5-8 arbejdsdage inden, at arbejdet skal udføres. Find kontaktoplysninger på side 2.

Ved frigravning skal mufferne altid understøttes.

Hvis graven skal være åben i mere end et døgn, skal muffen sikres med afdækning. Kablet skal tilsluttes igen ved telefonisk kontakt på samme måde, som da det blev afbrudt.

30 kV og 50 kV kabler

Denne type kabler kan være runde eller flade jernbåndsarmerede kabler eller runde kabler med plastkappe. Farven på kablerne er oftest sort. Kablerne kan desuden være dækket af betonsække, betonfliser, dækplast eller være støbt ind i en særlig blød type beton.

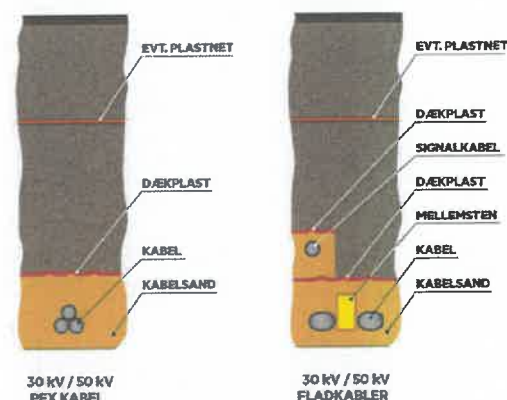

Typer af kabler

Lagene af kabelsand skal i komprimeret stand holde de angivne mål, som du finder på side 22.

NB!

Hvis et 30 kV eller 50 kV kabel skal graves fri, skal spændingen til kablet altid sikkerhedsafbrydes.


Bestil afbrydelsen ved at kontakte os på mail senest 5-8 arbejdsdage før, at du skal i gang med arbejdet (se side 2 for kontaktoplysninger).

Selve afbrydelsen foregår telefonisk efter vores anvisninger. Vær opmærksom på, at nogle kabler ikke kan afbrydes i længere perioder på grund af nettets driftssituation.

132 og 400 kV-elkabler (ejet af Energinet)

Efter liberaliseringen af elsektoren er transmissionsnettet ejet af Energinet. Kontakt derfor Energinet, hvis du skal grave nær ved 132 kV og 400 kV elkabler – herunder for at bestille sikkerhedsafbrydelse.

Ved kabelgrav med flere ledningsejere, skal du kontakte samtlige ledningsejere.

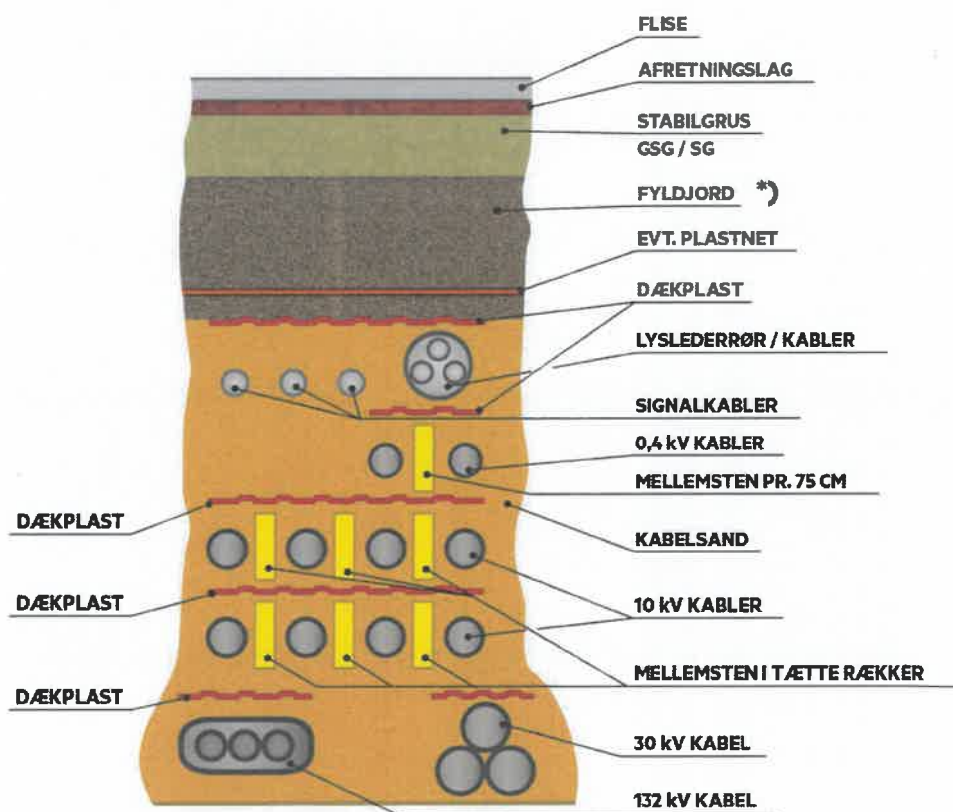

*) Fyldjord: egnet på stedet opgravet jord, harpet genbrugs-Vejjord (kun i fortovs- og vejarealer i Københavns kommune), harpet genbrugsjord, evt. stabilgrus.

Typer af kabler

Eksempel fra byområde med 0,4 kV, 10 kV, 30/50 kV og 132 kV elkabler samt signalkabler til styring og overvågning i samme kabelgrav

Kontakt os, før du går i gang

Skal du grave inden for en meters afstand til vores elkabler, så kontakt os altid, før du går i gang (find kontaktoplysninger på side 2). Cerius og Radius Elnets gravetilsyn hjælper med at afklare, hvordan du skal grave, og om du kan benytte maskiner til arbejdet.

Gravetilsynet er også behjælpelig med at afklare, hvornår vi kan sikkerhedsafbryde spændingen, hvis det er nødvendigt for at udføre gravearbejdet.

NB!

Læs om sikkerhedsafbrydelse og beskyttelse af elkabler på side 14-15.



Hvis du skal fjerne faste belægninger

Hvis du bruger skæremaskine, skal du passe på ikke at skære for dybt

Hvis du skal grave ned til dæksten eller dækplast

Hvis arbejdet udføres med minigraver, skal du være særligt opmærksom og følge Gravetilsynets anvisninger.

Der skal altid være observatør til stede med en håndskovl med træskaff. Observatøren skal kunne vejlede og varsko føreren af minigraveren.



Dæksten eller dækplast

Der skal altid være observatør til stede

Hvis du skal grave et elkabel fri

Skal du grave et elkabel fri eller blot grave ned på siden af kablet, skal der ALTID bruges håndskovl med træskaff – ikke drænspe, entreprenørgreb eller lignende redskaber.

Entreprenøren er ansvarlig for at forhindre underminering og udskridning af eksisterende ledninger og konstruktioner mv.

Foranstaltninger til at hindre underminering og udskridning skal være godkendt af Cerius eller Radius Elnets gravetilsyn.




Elkabler

Skal du grave et elkabel fri, skal du ALTID bruge håndskovl med træskaff

Sikkerhedsafbrydelse og beskyttelse

Sikkerhedsafbrydelse

- Begynd først at grave kablet fri, når du har fået besked fra os om, at spændingen er afbrudt.
- Indstil gravearbejdet, hvis vi bliver nødt til at tilslutte spændingen igen af hensyn til forsynings sikkerheden.

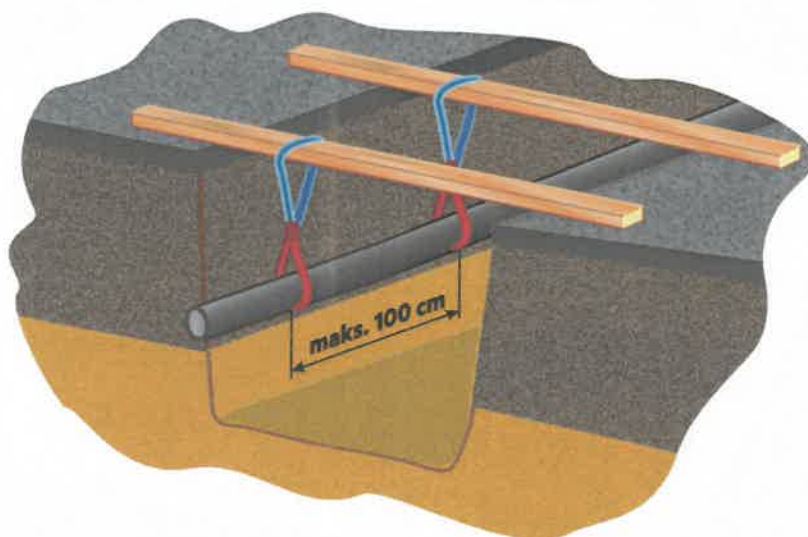

Kabelophæng

Kabelophæng skal udføres med solide stropper, som er fastgjort til bomme på tværs af kabelgraven. Bemærk, at stropperne ikke må kunne beskadige kablet. Du kan bruge dækplast til at lave den del af ophænget, som bærer kablet.


Beskyttelse af elkabler

Skal du grave et elkabel fri på en strækning, der er længere end en meter, skal du sørge for, at kablet bliver hængt op eller placeret i en beskyttelseskasse.

Hvis et 30 kV eller 50 kV kabel skal være gravet fri i mere end et døgn, skal det placeres i en beskyttelseskasse, og spændingen skal tilsluttes igen. Begynd først at grave kablet fri og lave beskyttelseskassen, når du har fået besked fra os om, at spændingen er afbrudt.

Kontakt Cerius eller Radius Elnets gravetilsyn (find kontaktoplysninger på side 2) for at få godkendt beskyttelseskasse, ophæng og for at få spændingen gentilslettet.

Når du skal fjerne kassen skal du kontakte vores gravetilsyn og aftale, hvornår de kan afbryde for spændingen på kablet.

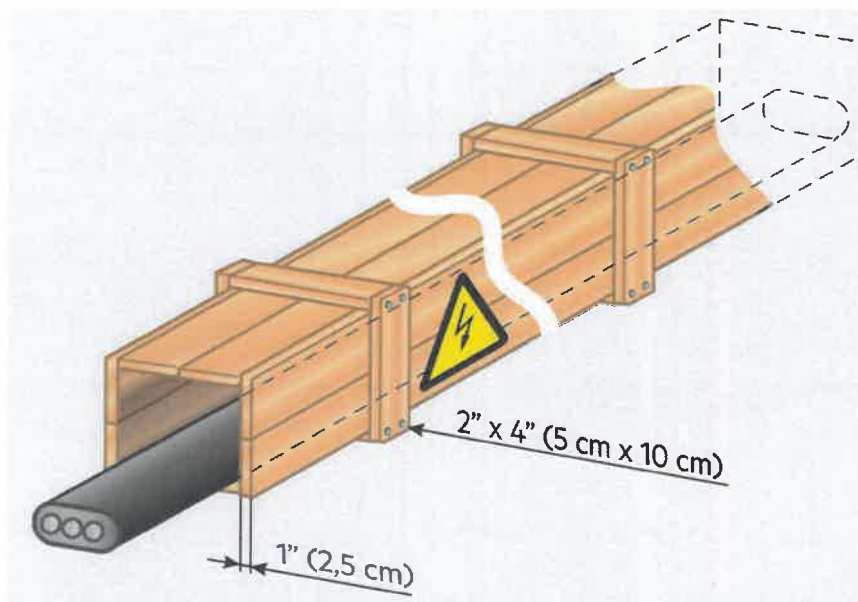

Beskyttelseskasse

Lav en beskyttelseskasse af 25 mm tykke, ru brædder eller af minimum 16 mm tykt krydsfiner. Sørg for, at kablet ligger stabilt på kassens bund og er understøttet i jorden ved begge ender af kassen. Beskyttelseskassen skal understøttes af solide stolper eller hænges op i kraftige bomme. NB! Husk at de brædder eller plader, som kassen laves af, skal være fri for søm.

Krydsning af elkabler ved jordfortrængning

Hvis du skal lave en styret underboring


Inden du går i gang med at lave en styret underboring, skal du altid kontakte vores Gravetilsyn (find kontaktoplysninger på side 2) for at afklare, hvordan arbejdet skal udføres – herunder eventuel prøvegravning og sikkerhedsafbrydelse af spænding til elkabler.

Ved skydning eller cracking af rørledning i nærheden af elkabler skal du altid sørge for

prøvegravning, så det kan konstateres, at der er sikker afstand mellem rør og kabler.

NB!

Hvis en underboring krydser kabler eller rør, skal du altid aftale arbejdsgangen med Gravetilsynet.

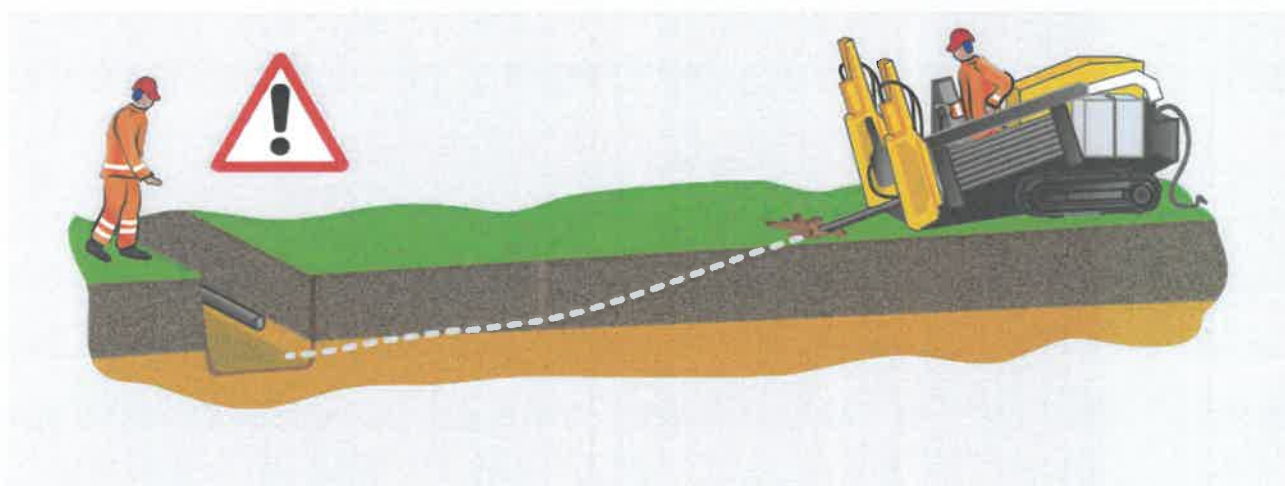

Underboring

Hvis du skal etablere en spuns

Skal du etablere en spuns nær ved et elkabel, så kontakt Cerius eller Radius Elnets gravetilsyn (find kontaktoplysninger på side 2) for at aftale nærmere:

- om kablet skal flyttes eller sikres.
- at der skal laves prøvegravninger ned til kablets dæksten eller dækplast
- at spunsjern bliver skåret af i 1,5 meters dybde, for at undgå de trækker kablet med op, når de fjernes.
- at arbejdet straks bliver indstillet, hvis der sker forskydninger eller udskridninger i jorden, og at Cerius eller Radius Elnets gravetilsyn hurtigt bliver tilkaldt for at sikre kablet.



Spuns

Skal du etablere en spuns nær ved et elkabel, så kontakt i god tid vores gravetilsyn (find kontaktoplysninger på side 2)


Hvis du skal krydse elkabler med fjernvarmerør

Er du i gang med at lægge fjernvarmerør og skal krydse et elkabel, så kontakt altid vores gravetilsyn for at aftale arbejdet (find kontaktoplysninger på side 2).

- Krydsningen skal være vinkelret.
- Afstand mellem elkabel og fjernvarmerør og evt. indbygning af ekstra isolering skal være aftalt med os.

Indbygning af ekstra isolering

Hvis du lægger fjernvarmerør på en strækning, som krydser elkabler, skal du orientere dig om vilkårene ved hjælp af skitserne og skemaet nedenfor.

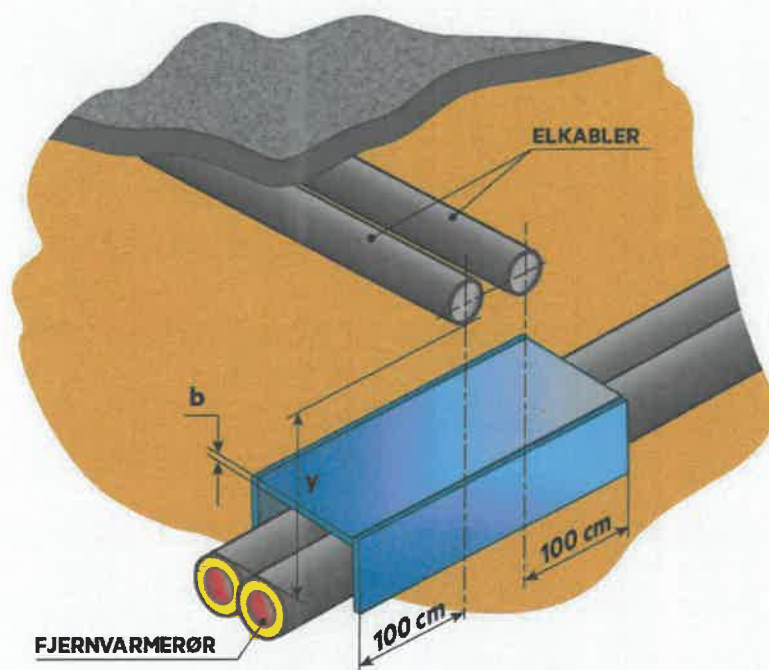

Underboring

Fjernvarmerør med isolering mod overliggende elkabel.





Er der krav om ekstra isolering, skal isoleringspladerne placeres direkte på varmerørene, så de ligger en meter uden for kablet til begge sider. De lodrette sider af fjernvarmerørene skal dækkes med isoleringsplader af samme tykkelse og i samme længde.

Skitserne nedenfor viser mere om indbygningen af ekstra isolering med styroporplader. Tabellen viser normale afstandskrav mellem elkabler og fjernvarmerør.

NB!

Minimumsafstanden (y), som fremgår af tabellen, kan ikke reduceres. Hverken ved at anvende isoleringsplader eller hvis der i forvejen ekstraisoleres ved at øge tykkelsen af isoleringen.

Isolering

Isolering af fjernvarmerør mod over- hhv. underliggende elkabler og kabelblokke				
Lavspændingskabler	$y = 10 \text{ cm}$ $b = 0 \text{ cm}$	$y = 10 \text{ cm}$ $b = 0 \text{ cm}$	$y = 10 \text{ cm}^*)$ $b = 0 \text{ cm}$	$y = 10 \text{ cm}^*)$ $b = 0 \text{ cm}$
10 kV kabler	$y = 10 \text{ cm}$ $b = 0 \text{ cm}$	$y = 10 \text{ cm}$ $b = 10 \text{ cm}$	$y = 20 \text{ cm}$ $b = 0 \text{ cm}$	$y = 20 \text{ cm}$ $b = 10 \text{ cm}$
30 kV / 50 kV kabler	$y = 30 \text{ cm}$ $b = 10 \text{ cm}$	$y = 30 \text{ cm}$ $b = 20 \text{ cm}$	$y = 30 \text{ cm}$ $b = 10 \text{ cm}$	$y = 30 \text{ cm}$ $b = 20 \text{ cm}$

x = dybde i jorden af kabel eller kabelblok (maks. 2 m)

y = mindsteafstand mellem kabel/kabelblok og ydersiden af fjernvarmerør.

b = tykkelse af isolering.

*) For kabelblokke med seks huller og derover gælder, at hvis alle huller i blokken ikke er i brug, skal afstanden til fjernvarmerøret regnes som for et 10 kV kabel – se denne sektion i tabellen.


Retablering af en kabelgrav

Når kabelgraven skal fyldes op efter endt arbejde, skal du sørge for at:

- Lægge 20 cm kabelsand omkring kablet og komprimere uden brug af maskine.
- Sætte mellemsten mellem kablerne og lægge muffefliser på plads, hvis du har været nødt til at fjerne dem under arbejdet.
- Lægge rød dækplast 10 cm over alle elkabler.

NB!

Husk, at der ikke må bruges maskine til komprimering under dækplasten.

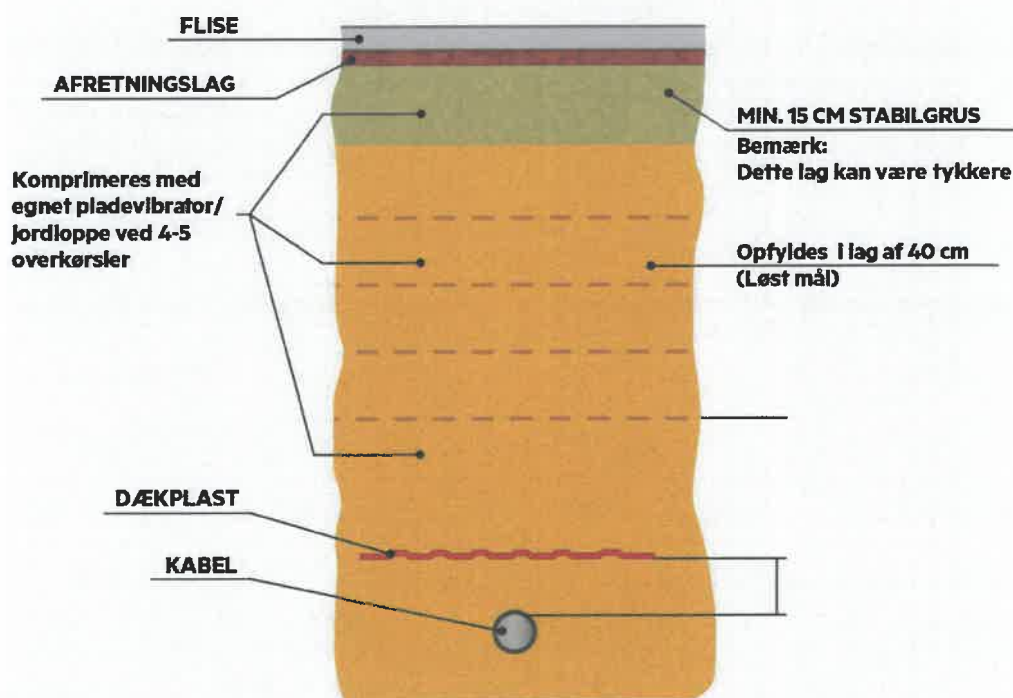

Retablering

Skitse der viser retablering af en kabelgrav

Genanvendelse af afrømmede eller opgravede materialer

Opfyldet omkring kablerne skal opfylde kravene i Almindelige Arbejdsbetingelser for Ledningsanlæg (AAB).

Som udgangspunkt skal de afrømmede eller opgravede materialer i ledningszonen genanvendes, når de opfylder kravene.

Komprimering nær ved elkabler

Når du retablerer kabelgraven, skal de komprimerede lag af opfyld svare til målene på de tegninger, du bruger under gravearbejdet.

Når du komprimerer nær ved elkabler, skal du vælge komprimeringsudstyr og metode, så du ikke beskadiger kablerne. Du må kun bruge maskine til komprimering af opfyld over dækplasten. Det første lag over dækplasten skal være 20 cm i løst mål.

Dækplast til afmærkning af elkabler

Når du retablerer kabelgraven, skal du sørge for, at sætte mellemsten mellem kablerne og lægge muffefliser på plads, hvis du har været nødt til at fjerne dem under arbejdet, og at der bliver lagt rød dækplast 10 cm over alle elkabler.

Er du i tvivl om, hvordan du skal retablere kabelgraven eller afmærke og dække kablerne, så kontakt vores gravetilsyn på (find kontaktoplysninger på side 2).

Afstand mellem kabler, ledninger og rør

Krav til afstand (meter) ved krydsning mellem elkabler og afløbs-, vand-, tele-, gas- og fjernvarmeledninger.

Krav til afstand			
Elkabel	0,4 kV	10 kV	30 kV/50 kV
Afløb	0,1	0,1	0,1
Vand	0,1	0,1	0,1
Tele	0,3	0,3	0,3
Gastransmissionsledning	0,3	0,3	0,3
Gasdistributions- og stikledning	0,3	0,3	0,75
Fjernvarme	Se side 19	Se side 19	Se side 19

Krav til afstand (meter) ved parallelføring af elkabler og afløbs-, vand-, tele-, gas- og fjernvarmeledninger.

Krav til afstand			
Elkabel	0,4 kV	10 kV	30 kV/50 kV
Afløb	0,3	0,3	0,3
Vand	0,3	0,5	0,5
Tele	0,2	0,3	0,3
Gastransmissionsledning	5	5	Særlig vurdering
Gasdistributions- og stikledning	0,3	0,3	0,75
Fjernvarme	1	1	1,5



Cerius og Radius Elnet A/S

Teknikerbyen 25

2830 Virum

9

Indlæs ledningspakke

- ☐ Alle ledningsejere
- ☐ Evida Service A/S
- ☐ FIBIA P/S
- ☐ GLOBALCONNECT A/S
- ☐ LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune
- ☐ Lyngby-Taarbæk Kommune
- ☐ Norlys Digital A/S
- ☐ Radius Elnet A/S
- ☒ TDC NET A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: TDC NET Ledningsoplysning
Email: ledningsoplysning@tdc.dk
Telefon: 70103000 #3

Generelle oplysninger
COVERLETTER.pdf

Gyldighedsdato
2026-10-14

Interesseområde
87397

ID
b7ba26a3-a363-4829-a68e-67972c1e323c



Følgeseddel til TDC NETs ledningsoplysninger

Generelle informationer

Du har via Ledningsejerregistret rekvireret oplysninger om TDC NETs ledninger.

LER-oplysningerne med TDC NETs ledninger vises i format fastlagt af Ledningsejerregistret.

LER-oplysningerne kan indeholde vigtige oplysninger om såvel ledningstracéer, enkelte ledninger, større ledningskonstruktioner (f.eks. en "blokledning") samt ledningskomponenter (et element der har tilknytning til ledninger) i dit arbejdsområde.

Du skal særligt være opmærksom på den nøjagtighedsklasse, der fremgår af oplysningerne!

Denne følgeseddel er en del af de samlede ledningsoplysninger, og det er derfor vigtigt, at du nøje læser følgesedlen, da den indeholder informationer af betydning for din tilrettelæggelse og udførelse af gravearbejdet.

Før der graves

1. Undgå ledningsskader

De samlede ledningsoplysninger skal være til stede på arbejdspladsen, og de skal anvendes i forbindelse med gravearbejdet.

Husk at du efter LER-loven har pligt til at tilrettelægge og udføre dit gravearbejde under hensyntagen til ledningsoplysningerne.

Du bør derfor altid starte dit arbejde med at lokalisere TDC NETs ledninger i hele arbejdsområdet.

Husk at én streg i LER-oplysningerne kan betyde, at der ligger en ledning, ét ledningstracé med flere ledninger eller en større ledningskonstruktion!

Du må først iværksætte gravearbejdet, når du er sikker på, at det kan udføres uden risiko for skader på TDC NETs ledninger.

Husk at følge anvisningerne i DS 475 om udførelse af arbejde i nærheden af ledningerne.

LER-lovens krav om tilrettelæggelse af arbejdet under hensyntagen til LER-oplysningerne gælder for alle typer af arbejder, der kan beskadige ledninger i jord, herunder også f.eks. overfladiske jordarbejder, skæring af asfalt, boring af huller og brolæggerarbejde, hvor der nedrammes genstande i vejarealet.

2. Lokalisering af ledningerne

Inden gravearbejdet iværksættes skal du være sikker på, hvor TDC NETs ledninger er placeret i forhold til dit gravearbejde.

Du skal derfor forsigtigt, med håndskovl, lokalisere ledningerne og afmærke dem, så du ved, hvor de er, inden gravearbejdet iværksættes.

Lokaliseringen skal som udgangspunkt ske ved prøvegravning, og kan du ikke finde ledningerne, hvor de burde ligge jf. LER-oplysningerne, kan du rekvirere en påvisning hos TDC NET.

Udfyld formular via vores hjemmeside, hvis du vil rekvirere en påvisning

<https://tdcnet.dk/anlaeg-visitering/paavisninger/>.

Du bedes kontakte TDC NET senest 4 hverdage/arbejdsdage, før påvisningen ønskes udført. Hvis du bestiller en påvisning, påvises ledningstracéet af en kabeltekniker fra TDC NET. Påvisningen udføres på baggrund af de LER-oplysninger, du har indhentet, forholdene på stedet samt kabelteknikerens måleudstyr. Påvisningen kan ske ved udpegning eller markering med spray og vil normalt blive udført med 0,5-1 meters nøjagtighed.

Efter påvisningen er du fortsat forpligtiget til at tilrettelægge og udføre gravearbejdet under hensyntagen til ledningerne, der fortsat skal lokaliseres (af dig), ligesom der skal holdes forsvarlig afstand under gravearbejdet. Viser påvisningen, at ledningerne ligger som vist i LER-oplysningerne

indenfor den oplyste nøjagtighedsklasse, opkræves betaling for påvisningen. Stikkabler til bygninger langs og under vej vil ikke altid være vist. Til private parceller vil stikkablerne normalt kun være vist til umiddelbart efter skel.

3. Ledningernes vejledende dybde på stedet

TDC NETs ledninger er normalt placeret i en dybde af 0,45-1,25 meter, men både større og mindre dybder kan forekomme.

Ledningerne kan som følge af de konkrete forhold på stedet være etableret i en anden dybde end normalt, og ledningerne kan på grund af efterfølgende gravearbejder eller arbejde med belægningen over ledningerne have ændret placering både horisontalt og vertikalt.

Du kan derfor ikke regne med nogen risikofri gravedybde!

4. Arbejder du med gravemaskine eller opgravningsfrie metoder?

Hvis gravearbejdet udføres med gravemaskine eller ved opgravningsfrie metoder, f.eks. styret underboring, skal du udvise særlig forsigtighed, da ledningen utvivlsomt vil blive beskadiget, hvis den bliver ramt i forbindelse med gravearbejdet.

Der må ikke udføres gravearbejde med maskine i nærheden af TDC NETs ledninger!

Ved enhver form for anvendelse af opgravningsfrie metoder, hvor der ikke er visuel kontakt med graveudstyret, i nærheden af TDC NETs ledninger, skal disse først frigraves, så det kan sikres, at anvisningerne i DS 475 kan overholdes.

Ved parallelføringer og krydsninger skal du holde afstand til TDC NETs ledninger. Du skal særligt være opmærksom på afstandskravene i DS 475.

5. Gyldighedsperiode

De indhentede ledningsoplysninger er gældende i den periode, der specifikt fremgår af LER-oplysningerne.

Hvis skaden sker...

Hvis skaden sker, og TDC NETs ledninger beskadiges i forbindelse med dit gravearbejde, skal du straks kontakte TDC NET via linket <https://tdcnet.dk/anlaeg-visitering/kabelovergravning/>

Indkaldelser til ledningsejermøde fremsendes direkte til anLvisitering@tdc.dk. Situationsplan og lign. bedes venligst vedhæftet.

Henvendelser vedr. flytning af kabler eller skabe bestilles på <https://tdcnet.dk/anlaeg-visitering/>

Kontaktinformationer TDC NET

Disse oplysninger er udleveret af TDC NET via Ledningsejerregistret.

Venlig hilsen

TDC NET Planudlevering

Tlf. 70122110 - tast 1

Mail: ledningsoplysning@tdc.dk
